Sprint 4 Planning

✅ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
- Rever o backlog e a ordem das stories - Rever as ações da retrospetiva da Sprint 3 - Confirmar a disponibilidade da equipa - Verificar se o código já cobre alguma story	- Confirmar os pontos de cada story (escala de Fibonacci) - Confirmar o sprint goal com valor para o hotel - Confirmar os responsáveis - Combinar os nomes das classes novas	- Atualizar o quadro no Jira (sprint, datas e responsáveis) - Fazer o daily scrum todos os dias - Ponto de controlo a meio da sprint (03/11) - Validar as stories com os testes de aceitação

👥 Membros da equipa do sprint

Nome	Função
José Cruz	Team Leader (Scrum Master e Product Owner) e developer
Tiago Borja	Developer
Lukas Sperandio	Developer
Pedro Costa	Developer
António Martinho	Developer

✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint

Resumo do sprint anterior

Sprint goal	Sprint 3: o hotel passa a ter os seus 20 quartos e os preços por noite no sistema. A receção já consegue dizer ao cliente que quartos existem e quanto custam, e cada funcionário só usa as funções do seu papel.
Pontos da história	30 pontos no Jira (24 no planeamento, mais 6 porque a H4Y-28 subiu de 2 para 8 pontos). 25 concluídos (H4Y-7, H4Y-8, H4Y-23, H4Y-25, H4Y-26, H4Y-28 e H4Y-50). 5 pontos em carry-over (H4Y-9 e H4Y-51).
Resumo	Concluídos: regra de funções por papel, pisos e zonas, quartos, preço base, lista de quartos e correções dos diagramas de casos de uso e de sequência. A H4Y-9 e a H4Y-51 passam para a Sprint 4. A retrospetiva pediu para ordenar as tarefas pelas dependências e definir um ponto de controlo a meio da sprint.

Agenda

1. Rever o resumo da Sprint 3, a retrospetiva e o carry-over (H4Y-9 e H4Y-51)
2. Confirmar o objetivo da Sprint 4
3. Confirmar a capacidade e o limite de pontos
4. Estimar as H4Y-52, H4Y-53, H4Y-54 e H4Y-56 (escala de Fibonacci)
5. Confirmar a divisão das subtarefas
6. Combinar os nomes das classes novas e o script SQL partilhado
7. Rever os riscos
8. Marcar o ponto de controlo de 03/11 e a reunião de alinhamento das regras de negócio, se ainda não aconteceu (ação da retrospetiva da Sprint 2)

Detalhes

Data de início	31/10/2026
Data de término	06/11/2026
Sprint goal	A receção passa a atender os clientes ao balcão: regista e encontra clientes, diz que quartos estão livres nas datas pedidas e cria a reserva.

Planeamento da capacidade

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	7 dias - 5 úteis	7 dias - 5 úteis
Capacidade da equipa	50 h (5 elementos x 10 h; 2 h por dia)	50 h (5 elementos x 10 h)
Capacidade prevista	20 pontos (15 de histórias novas e 5 de carry-over). Limite: 21 pontos, a média das Sprints 2 e 3 (18 e 25).	30 pontos no fim da sprint (24 no planeamento). 25 concluídos.
Capacidade individual	8 h por elemento	8 h por elemento
Estimação	Story points na escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)	Story points na escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)

Possíveis riscos

Risco	Mitigação
A H4Y-72 precisa da tabela customers da H4Y-69, porque reservations tem uma chave estrangeira para customers. A retrospetiva pediu menos dependências entre tickets.	O Lukas e o Pedro fazem merge cedo de um único script SQL (v7) com customers e reservations. Até lá, os testes usam repositórios em memória.
O diagrama de classes não tem os repositórios de clientes, reservas e itens. Duas pessoas podem criar classes parecidas.	Combinar os nomes no primeiro dia. Cada PR atualiza o código e o docs/uml juntos.
A H4Y-70 e a H4Y-71 alteram o client.fxml. A H4Y-68, a H4Y-70, a H4Y-73 e a H4Y-76 acrescentam botões ao menu. Conflitos de merge.	O José faz merge primeiro do ecrã de clientes e o Lukas acrescenta depois o separador de pesquisa. Os botões do menu entram em PRs pequenos.
A H4Y-28 subiu de 2 para 8 pontos durante a Sprint 3 e os documentos não acompanharam. As estimativas podem voltar a falhar (retrospetiva).	Confirmar os pontos na reunião de planeamento. Registar qualquer mudança de âmbito no momento em que acontece.
H4Y-9: o diagrama está com mau aspeto, porque algumas alterações não são bem suportadas pelo Mermaid, e não tem portos de saída.	O card no Jira tem o que falta. O José corrige o diagrama primeiro.
Q-05 (diferença entre cancelar e apagar) não está confirmada pelo professor. Afeta a H4Y-55 na Sprint 5.	Perguntar na próxima aula prática.
O trabalho pode voltar a concentrar-se nos últimos dias da sprint (retrospetiva).	Ponto de controlo a 03/11: H4Y-69, H4Y-72 e o script SQL têm de estar no main. Se não estiverem, a H4Y-51 é a primeira a sair, porque não tem ligação ao sprint goal.

Backlog da sprint (por prioridade)

A coluna N.º dá a ordem de trabalho. Primeiro o carry-over, depois as histórias que criam a base das outras (clientes e reservas). Os pontos seguem a escala de Fibonacci.

N.º	Chave	Item (título no quadro)	Tipo	Pontos (Fibonacci)	Responsável
1	H4Y-9	H4Y - Criação do Diagrama UML de Componentes	Tarefa (carry-over)	3	José Cruz
2	H4Y-51	Cadastrar item de stock	História (carry-over)	2	Tiago Borja
3	H4Y-52	Registar um novo cliente	História	3	Lukas Sperandio, José Cruz
4	H4Y-54	Consultar quartos livres por tipo e noites	História	5	Pedro Costa, Tiago Borja
5	H4Y-53	Procurar um cliente já registado	História	2	Lukas Sperandio
6	H4Y-56	Criar uma reserva para um cliente	História	5	António Martinho
		Total		**20**	

Divisão dos pontos

No Jira só as histórias têm pontos. A divisão da H4Y-52 (2 + 1) e da H4Y-54 (3 + 2) é uma estimativa. O Pedro tem menos pontos porque a H4Y-72 tem a regra de sobreposição de datas, o maior risco da sprint.


Responsável	Trabalho	Pontos
José Cruz	H4Y-9 (3) e H4Y-70 (1)	4
Tiago Borja	H4Y-68 (2) e H4Y-73 (2)	4
Lukas Sperandio	H4Y-69 (2) e H4Y-71 (2)	4
Pedro Costa	H4Y-72 (3)	3
António Martinho	H4Y-75 (3) e H4Y-76 (2)	5


Tarefas da sprint (subtarefas, iguais ao quadro do Jira)

Nível 1: não depende de outra subtarefa. Nível 2: começa depois do nível 1 estar em curso. Nível 3: usa o trabalho do nível 2 (ação da retrospetiva).

Chave	Subtarefa (título no quadro)	Item pai	Responsável	Nível
H4Y-68	51.1 Cadastrar item de stock: StockService.createItem, ecrã e testes	H4Y-51	Tiago Borja	1
H4Y-69	52.1 Serviço: ClientService.register, repositório de clientes, duplicado e testes	H4Y-52	Lukas Sperandio	1
H4Y-72	54.1 Serviço: RoomService.isAvailable e searchRooms, regra de sobreposição de datas e testes	H4Y-54	Pedro Costa	1
H4Y-70	52.2 Ecrã: client.fxml e ClientController para registar clientes	H4Y-52	José Cruz	2
H4Y-71	53.1 Procurar cliente por documento: serviço, ecrã e testes	H4Y-53	Lukas Sperandio	2
H4Y-73	54.2 Ecrã: pesquisa de quartos livres por tipo e datas	H4Y-54	Tiago Borja	2
H4Y-75	56.1 Serviço: ReservationService.create, repositório de reservas, recusa de sobreposição e testes	H4Y-56	António Martinho	2
H4Y-76	56.2 Ecrã: criar reserva a partir do cliente e do quarto livre escolhidos	H4Y-56	António Martinho	3
H4Y-9	Sem subtarefas. O que falta está no comentário do card.	-	José Cruz	1

Quadro do Jira (início da Sprint 4)

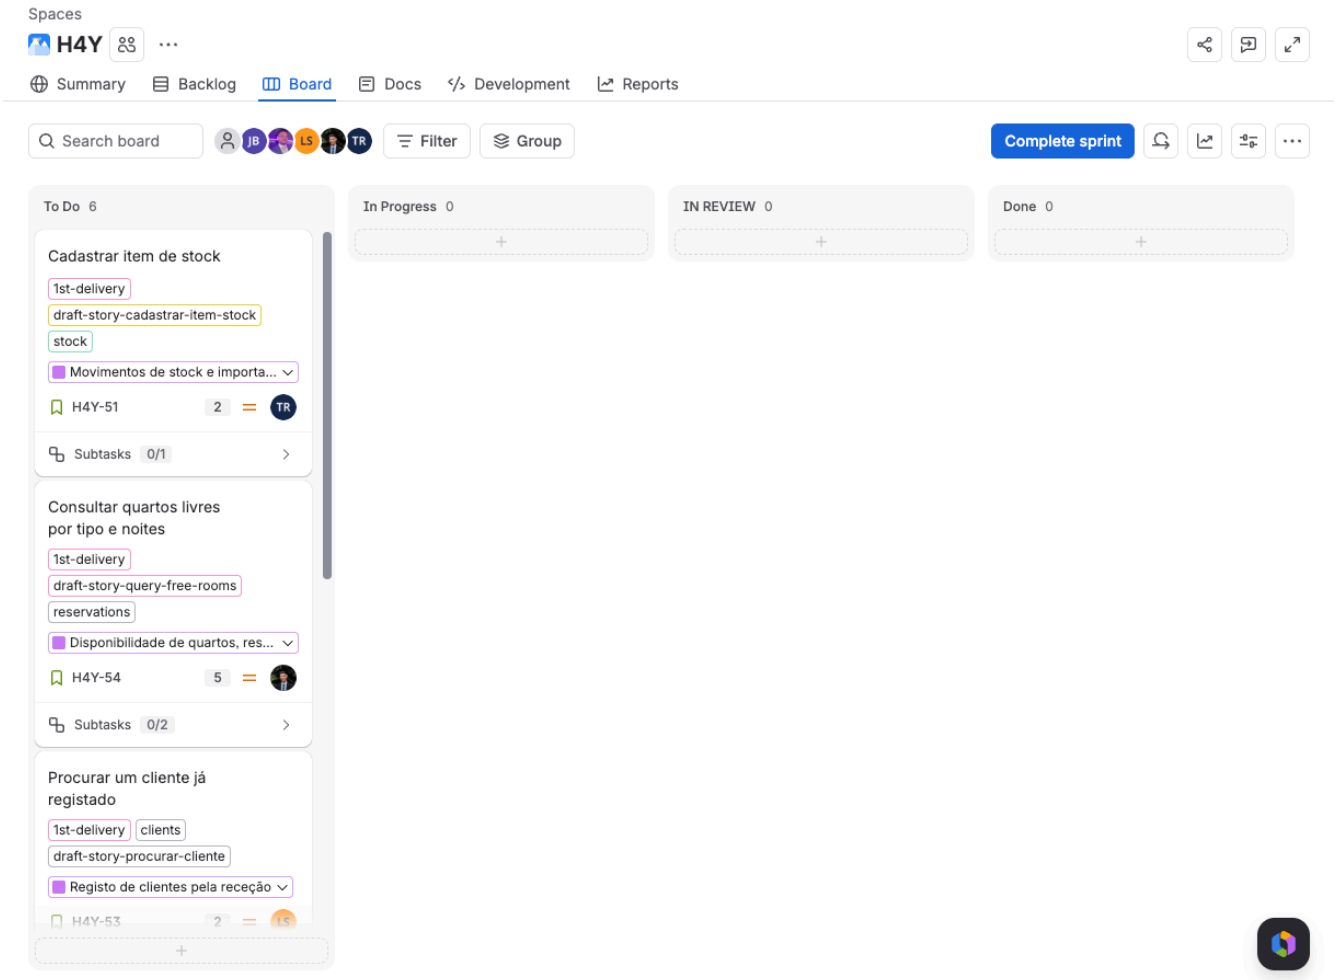

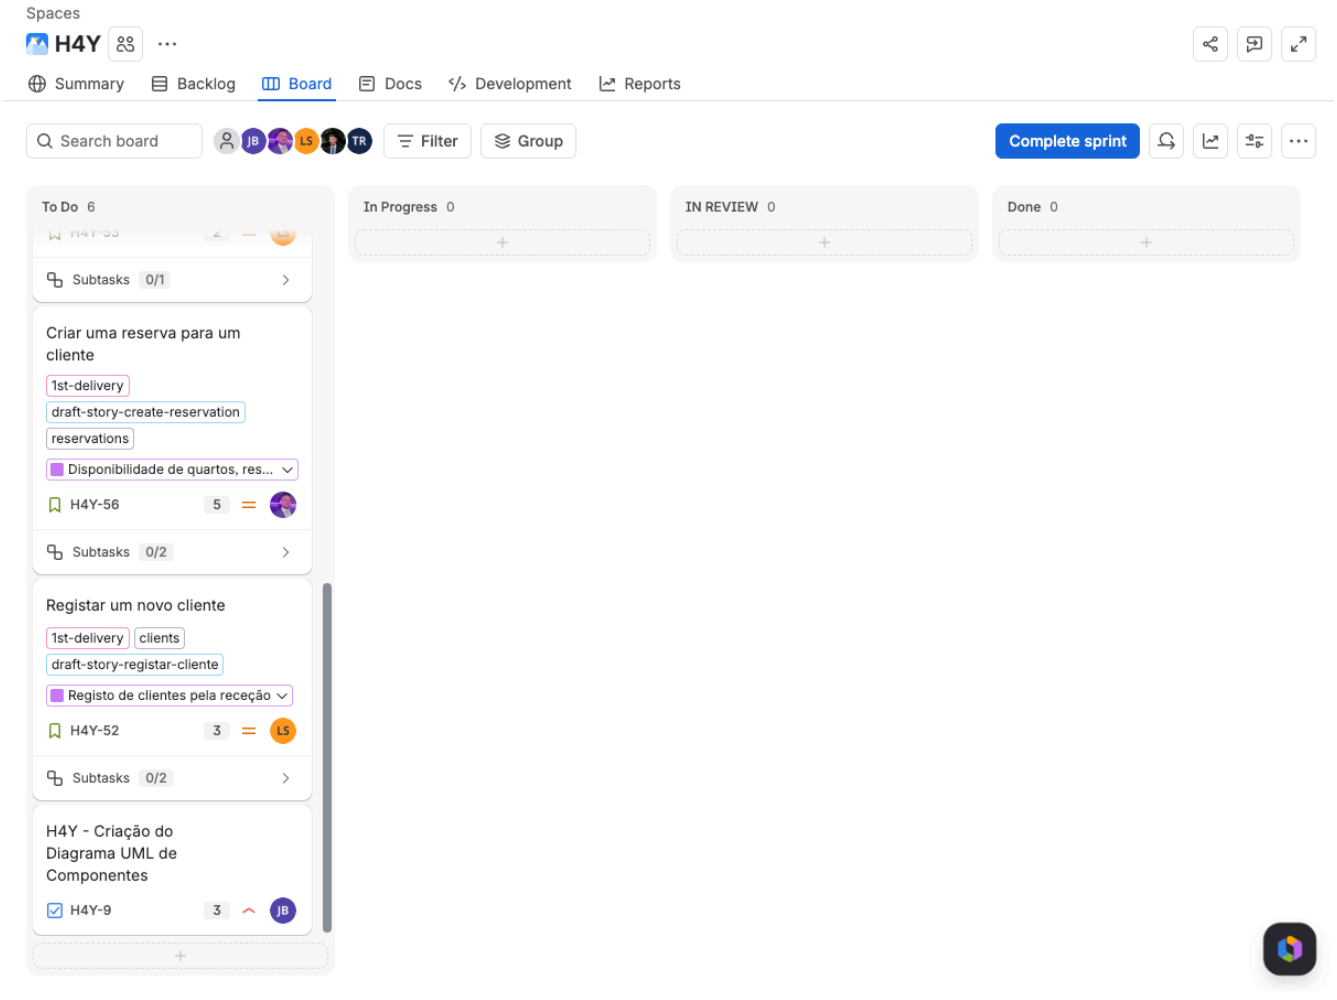

Created by: jmbcruz. Updated by: jmbcruz. AI use: sprint-planner, Claude Code (claude-opus-5-5), 2026-10-31. Reviewed by: pending.
