Sprint 5 Planning

✅ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
- Rever o backlog e o resultado da Sprint 4 - Selecionar os itens por concluir com responsável - Confirmar 8 h por elemento	- Rever o objetivo e os pontos do Jira - Manter os responsáveis atribuídos - Identificar dependências e riscos	- Atualizar o sprint e as datas no Jira - Guardar o quadro inicial - Fazer o daily scrum - Ponto de controlo a 10/11

👥 Membros da equipa do sprint

Nome	Função
Pedro Costa	Scrum Master e developer
Tiago Borja	Developer
Lukas Sperandio	Developer
José Cruz	Developer (José Bonito no Jira)
António Martinho	Developer

🖍️ Itens da reunião de planeamento do sprint

Resumo do sprint anterior

Sprint goal	Sprint 4: a receção passa a atender os clientes ao balcão: regista e encontra clientes, diz que quartos estão livres nas datas pedidas e cria a reserva.
Pontos da história	18 pontos concluídos no Jira: H4Y-9 (3), H4Y-51 (2), H4Y-52 (3), H4Y-54 (5) e H4Y-56 (5). O planning inicial previa 20 pontos; a H4Y-53, de 2 pontos, não consta do sprint encerrado no Jira.
Resumo	Os cinco itens do Sprint 4 estão em Done. Não há carry-over destes itens para o Sprint 5. O novo sprint inclui os oito itens ainda por concluir e com responsável atribuído.

Agenda

1. Rever os resultados da Sprint 4 e confirmar que não há carry-over.
2. Confirmar o objetivo e os oito itens atribuídos.
3. Rever as 40 h disponíveis e o risco dos 26 pontos selecionados.
4. Coordenar os ecrãs de reservas e as regras de cancelamento, eliminação e check-in.
5. Combinar revisões durante o sprint e o ponto de controlo de 10/11.

Detalhes

Data de início	07/11/2026
Data de término	12/11/2026
Sprint goal	A receção passa a gerir reservas, cancelamentos, check-in e check-out num fluxo mais simples e consistente.

Planeamento da capacidade

	Sprint atual	**Sprint anterior**
Total de dias	6 dias de calendário; 4 dias úteis	7 dias de calendário; 5 dias úteis
Capacidade da equipa	40 h disponíveis (5 elementos × 8 h)	40 h disponíveis (5 elementos × 8 h)
Capacidade prevista	26 pontos: 24 de histórias e 2 de tarefas. Inclui todos os itens atribuídos por concluir, por indicação do Scrum Master.	20 pontos no planning inicial; 18 pontos concluídos no Jira.
Capacidade individual	8 h por elemento	8 h por elemento
Estimação	Pontos existentes no Jira, sem alteração. Escala de Fibonacci.	Escala de Fibonacci.

Os 26 pontos excedem os 18 concluídos na Sprint 4 e a referência de 21 pontos usada no planning anterior. A seleção mantém todos os itens atribuídos, conforme indicado. Os pontos não são uma conversão direta de horas.

Possíveis riscos

Risco	**Mitigação proposta**
26 pontos numa semana mais curta. Tiago tem 10 pontos e Lukas tem 8.	Rever o progresso a 10/11. Sinalizar bloqueios no daily e combinar apoio e revisões cedo. Registar qualquer alteração de âmbito no Jira.
H4Y-80, H4Y-81 e H4Y-82 partilham o fluxo de reservas e podem alterar os mesmos ecrãs.	Combinar os contratos e os ficheiros antes de editar. Integrar alterações pequenas e testar o percurso completo de reserva, check-in e check-out.
Cancelar e apagar têm efeitos diferentes. Uma reserva com check-in não deve seguir o fluxo de eliminação anterior ao check-in.	José e António alinham as regras dos seus tickets com Lukas. Confirmar dúvidas de requisitos com o professor antes de impor regras novas.
O estilo comum da H4Y-83 pode criar conflitos com os novos ecrãs.	Pedro combina os estilos partilhados com Tiago e Lukas e mantém as alterações visuais separadas das regras de negócio.
A H4Y-84 pode ser confundida com implementação do importador JSON.	Manter o âmbito do ticket: rever os diagramas e a documentação para JSON além de XML.

Backlog da sprint (por prioridade)

Os itens estão ordenados pela prioridade do Jira: Máxima (Highest), Alta (High), Média (Medium) e Baixa (Low). Os responsáveis e pontos são os do Jira. Só entraram itens por concluir com responsável. A H4Y-58, sem responsável, ficou no backlog.

N.º	Chave	Item (título no quadro)	Tipo	Prioridade	Pontos	Responsável
1	H4Y-80	Criar uma reserva em três passos: cliente, quarto e confirmação	História	Máxima	2	Tiago Borja
2	H4Y-81	Ver e gerir as reservas ativas no ecrã principal da receção	História	Máxima	8	Tiago Borja
3	H4Y-82	Fazer o check-in e o check-out de uma reserva	História	Máxima	5	Lukas Sperandio
4	H4Y-57	Apagar uma reserva antes do check-in	História	Alta	3	António Martinho
5	H4Y-55	Cancelar uma reserva mantendo o histórico	História	Média	3	José Cruz
6	H4Y-85	Editar uma conta de funcionário	História	Baixa	3	Lukas Sperandio
7	H4Y-83	Aplicar um estilo comum a todos os ecrãs	Tarefa	Baixa	1	Pedro Costa
8	H4Y-84	Rever diagramas e documentação da entrada de stock para aceitar ficheiros JSON além de XML	Tarefa	Baixa	1	António Martinho
		Total			**26**	


Divisão dos pontos


Responsável	Trabalho	Pontos
Pedro Costa	H4Y-83 (1) e coordenação como Scrum Master	1
Tiago Borja	H4Y-80 (2) e H4Y-81 (8)	10
Lukas Sperandio	H4Y-82 (5) e H4Y-85 (3)	8
José Cruz	H4Y-55 (3)	3
António Martinho	H4Y-57 (3) e H4Y-84 (1)	4
Total		**26**

Fontes: Jira, Sprint 4 encerrado e Sprint 5 ativo, consultados a 07/11/2026; planning da Sprint 4 na branch docs. Datas, inclusão dos itens atribuídos e disponibilidade confirmadas pelo Scrum Master.

Quadro do Jira (início da Sprint 5)

07/11/2026: 8 itens em To Do; 0 em In Progress, In Review e Done. Capturas reais do board, com deslocação na coluna To Do.

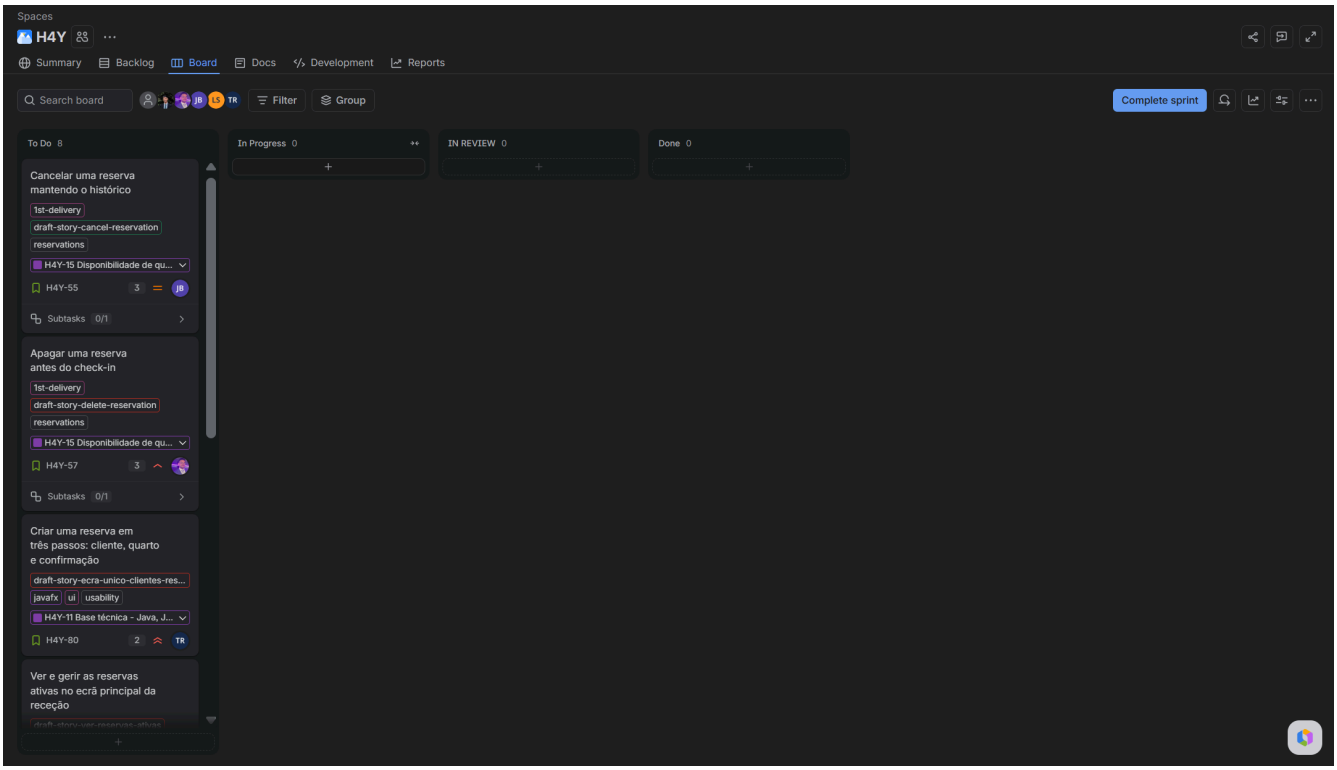

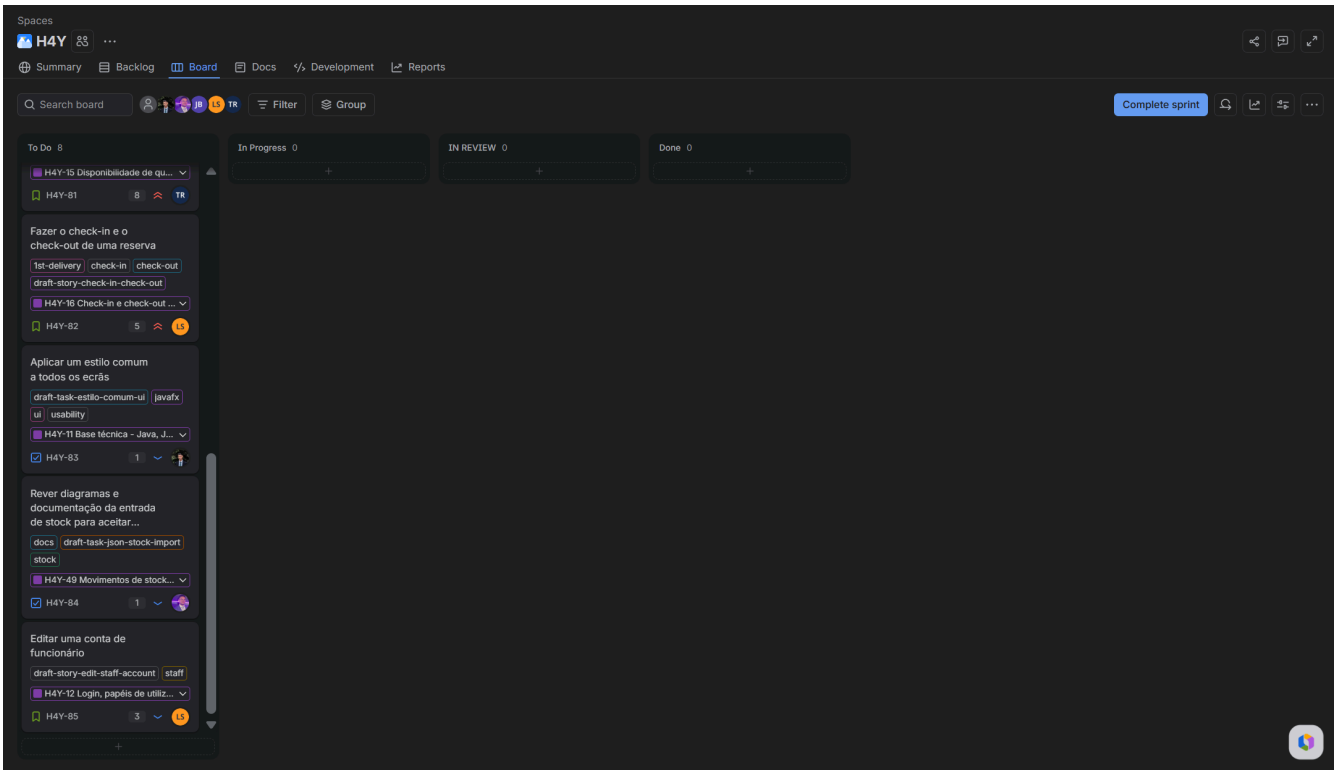

Created by: pedrocostaisep. Updated by: pedrocostaisep. AI use: sprint-planner, OpenAI Codex (gpt-6.1-sol), 2026-11-07. Reviewed by: pending.
