Sprint 3 Planning

✅ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
- Rever o backlog e a ordem das stories - Confirmar os pontos de cada story (escala de Fibonacci) - Confirmar a disponibilidade da equipa - Verificar se o código já cobre alguma story	- Definir o sprint goal com valor para o hotel - Confirmar a capacidade (mínimo de 13 pontos) - Selecionar as stories e atribuir responsáveis - Combinar os nomes das classes novas	- Atualizar o quadro no Jira (sprint, datas e responsáveis) - Fazer o daily scrum todos os dias para verificar o andamento da sprint - Validar as stories com os testes de aceitação - Reunião de alinhamento das regras de negócio

👥 Membros da equipa do sprint

Nome	Função
Lukas Sperandio	Team Leader (Scrum Master e Product Owner) e developer
Tiago Borja	Developer
Pedro Costa	Developer
António Martinho	Developer
José Cruz	Developer

✏️ Itens da reunião de planeamento do sprint

Resumo do sprint anterior

Sprint goal	Sprint 2: o gestor inicia sessão e cria contas de funcionário. O rececionista inicia sessão e vê a janela principal com as funções do seu papel.
Pontos da história	27 pontos planeados. 18 concluídos (H4Y-32, H4Y-20, H4Y-22, H4Y-24 e H4Y-27). 9 pontos em carry-over (H4Y-7, H4Y-8 e H4Y-9).
Resumo	Concluídos: fundação do projeto, login do gestor e do rececionista, janela principal e criação de contas. A retrospetiva pediu correções nos diagramas de casos de uso (H4Y-7), de sequência (H4Y-8) e de componentes (H4Y-9). Os três passam para a Sprint 3.

Agenda

1. Rever o resumo da Sprint 2, a retrospetiva e o carry-over (H4Y-7, H4Y-8 e H4Y-9)
2. Definir o objetivo da Sprint 3
3. Confirmar a capacidade e o limite de pontos
4. Estimar as stories em story points (escala de Fibonacci) e ordenar o backlog por prioridade
5. Selecionar as stories e distribuir as subtasks
6. Combinar os nomes das classes novas e a ordem dos scripts SQL
7. Rever os riscos
8. Marcar a reunião de alinhamento das regras de negócio (ação da retrospetiva)

Detalhes

Data de início	24/10/2026
Data de término	30/10/2026
Sprint goal	O hotel passa a ter os seus 20 quartos e os preços por noite no sistema. A receção já consegue dizer ao cliente que quartos existem e quanto custam, e cada funcionário só usa as funções do seu papel.

Planeamento da capacidade

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	7 dias - 5 úteis	7 dias - 5 úteis
Capacidade da equipa	50 h (5 elementos x 10 h)	50 h (5 elementos x 10 h)
Capacidade prevista	24 pontos (13 de histórias novas, 9 de carry-over e 2 da H4Y-51)	27 pontos planeados (previsão sem histórico). 18 concluídos.
Capacidade individual	8 h por elemento	8 h por elemento
Estimação	Story points na escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)	Story points na escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)

Possíveis riscos

Risco	Mitigação
24 pontos estão acima da velocidade da Sprint 2 (18 pontos).	9 pontos são correções de diagramas já começados. Se a sprint atrasar, a H4Y-51 é a primeira a passar para a Sprint 4.
Três elementos têm uma story nova e um carry-over: Pedro (H4Y-25 e H4Y-8), António (H4Y-50 e H4Y-7) e José (H4Y-26 e H4Y-9).	As correções dos diagramas vêm primeiro. Se atrasarem, o Tiago ajuda.
O diagrama de classes não tem os repositórios de pisos, quartos e tipos de quarto. Duas pessoas podem criar classes parecidas.	Combinar os nomes no primeiro dia. Cada PR atualiza o código e o docs/uml juntos.
Quatro stories acrescentam botões ao MainController e ao main.fxml. Conflitos de merge.	Fazer merge primeiro da H4Y-61 (menu por papel). Os outros acrescentam o botão já com a regra nova.
A tabela rooms (H4Y-25) depende das tabelas floors (H4Y-28) e room_types (H4Y-26).	Merge cedo da H4Y-62 e da H4Y-65. Até lá, os testes usam repositórios em memória.
A equipa interpreta as regras de negócio de formas diferentes (retrospetiva).	Reunião de alinhamento no início da sprint.
Q-01 (20 quartos, 7/10/3) e Q-11 (o gestor define o preço base) não estão confirmadas pelo professor.	Perguntar na próxima aula prática.

Backlog da sprint (por prioridade)


A coluna N.º dá a ordem de trabalho. A coluna Prior. é a prioridade do card no Jira (Alta = High, Média = Medium). Ordem: primeiro as correções pedidas pelo professor (carry-over, prioridade Alta no Jira), depois as histórias que criam a base das outras (regra por papel, pisos e tipos de quarto), depois o registo dos quartos (sprint goal). A H4Y-51 é a primeira a sair se a sprint atrasar.


N.º	Prior. (Jira)	Chave	Item (título no quadro)	Tipo	Pontos (Fibonacci)	Responsável
1	Alta	H4Y-7	H4Y - Criação dos Diagramas UML de Casos de Uso	Tarefa (carry-over)	3	António Martinho
2	Alta	H4Y-8	H4Y - Criação dos Diagramas de Sequência	Tarefa (carry-over)	3	Pedro Costa
3	Alta	H4Y-9	H4Y - Criação do Diagrama UML de Componentes	Tarefa (carry-over)	3	José Cruz
4	Média	H4Y-23	Mostrar apenas as funções permitidas ao papel	História	3	Lukas Sperandio
5	Média	H4Y-28	Consultar os pisos e zonas do hotel	História	2	Tiago Borja
6	Média	H4Y-26	Definir o preço base por noite de cada tipo de quarto	História	3	José Cruz
7	Média	H4Y-25	Registar os 20 quartos por tipo e piso	História	3	Pedro Costa
8	Média	H4Y-50	Consultar a lista de quartos	História	2	António Martinho
9	Média	H4Y-51	Cadastrar item de stock	História	2	Tiago Borja
			Total		**24**	


Tarefas da sprint (subtarefas, iguais ao quadro do Jira)

Chave	Subtarefa (título no quadro)	Item pai	Responsável
H4Y-60	23.1 Serviço: regra de funções por papel no HotelFacade e testes	H4Y-23	Lukas Sperandio
H4Y-61	23.2 Ecrã: menu da janela principal usa a regra por papel e pede login sem sessão	H4Y-23	Lukas Sperandio
H4Y-62	28.1 Consultar pisos e zonas: repositório, serviço, ecrã e testes	H4Y-28	Tiago Borja
H4Y-65	26.1 Serviço: RoomService.setBasePrice, validação, papel e testes	H4Y-26	José Cruz
H4Y-66	26.2 Ecrã: tabela de tipos de quarto com o preço base editável	H4Y-26	José Cruz
H4Y-63	25.1 Serviço: RoomService.saveRoom, repositório de quartos, regras de piso e testes	H4Y-25	Pedro Costa
H4Y-64	25.2 Ecrã: rooms.fxml e RoomController para registar quartos	H4Y-25	Pedro Costa
H4Y-67	50.1 Lista de quartos: serviço, ecrã com filtro por tipo e botão do rececionista	H4Y-50	António Martinho
H4Y-68	51.1 Cadastrar item de stock: StockService.createItem, ecrã e testes	H4Y-51	Tiago Borja
H4Y-7, H4Y-8, H4Y-9	Sem subtarefas. As correções pedidas estão na descrição de cada card.	-	-

Quadro do Jira (início da Sprint 3)

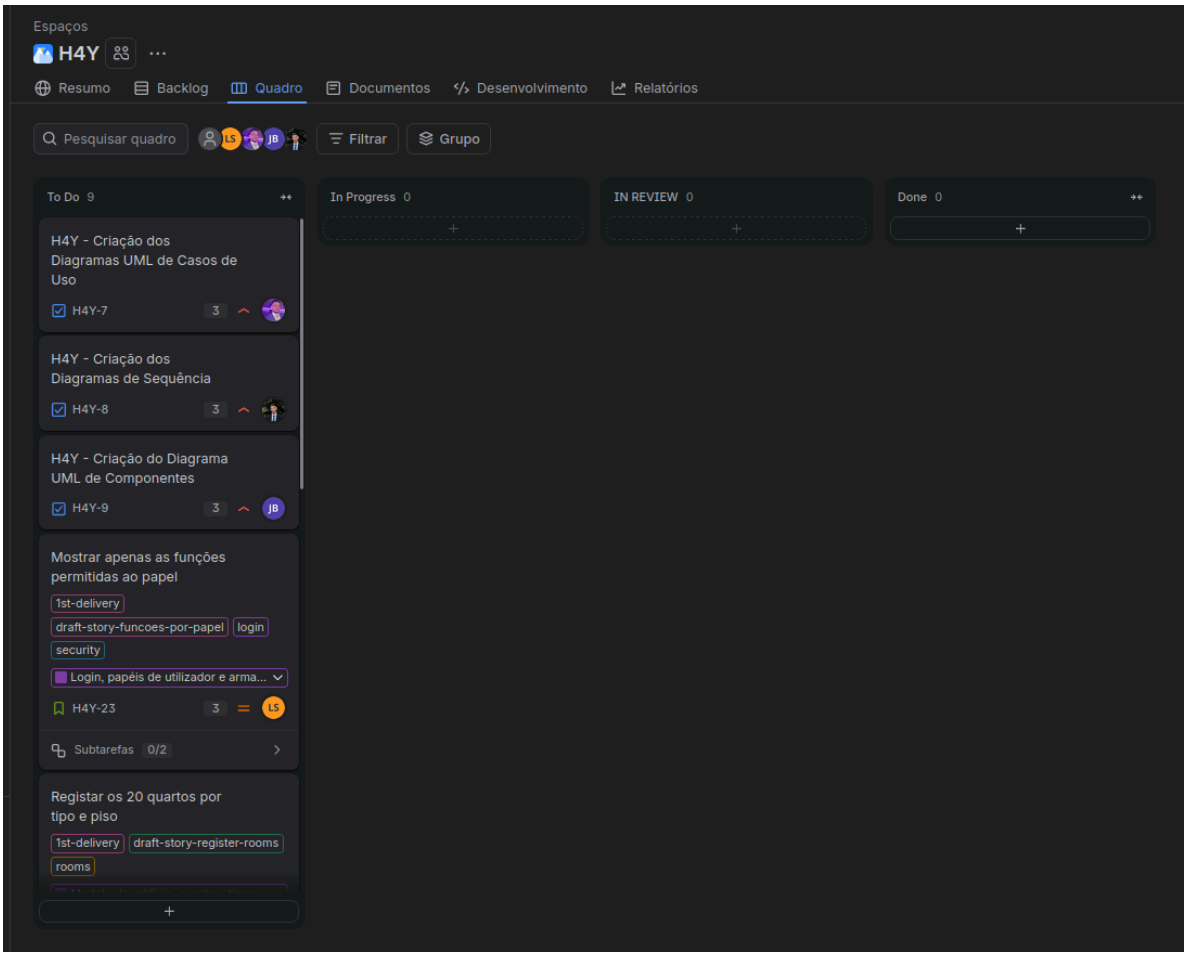

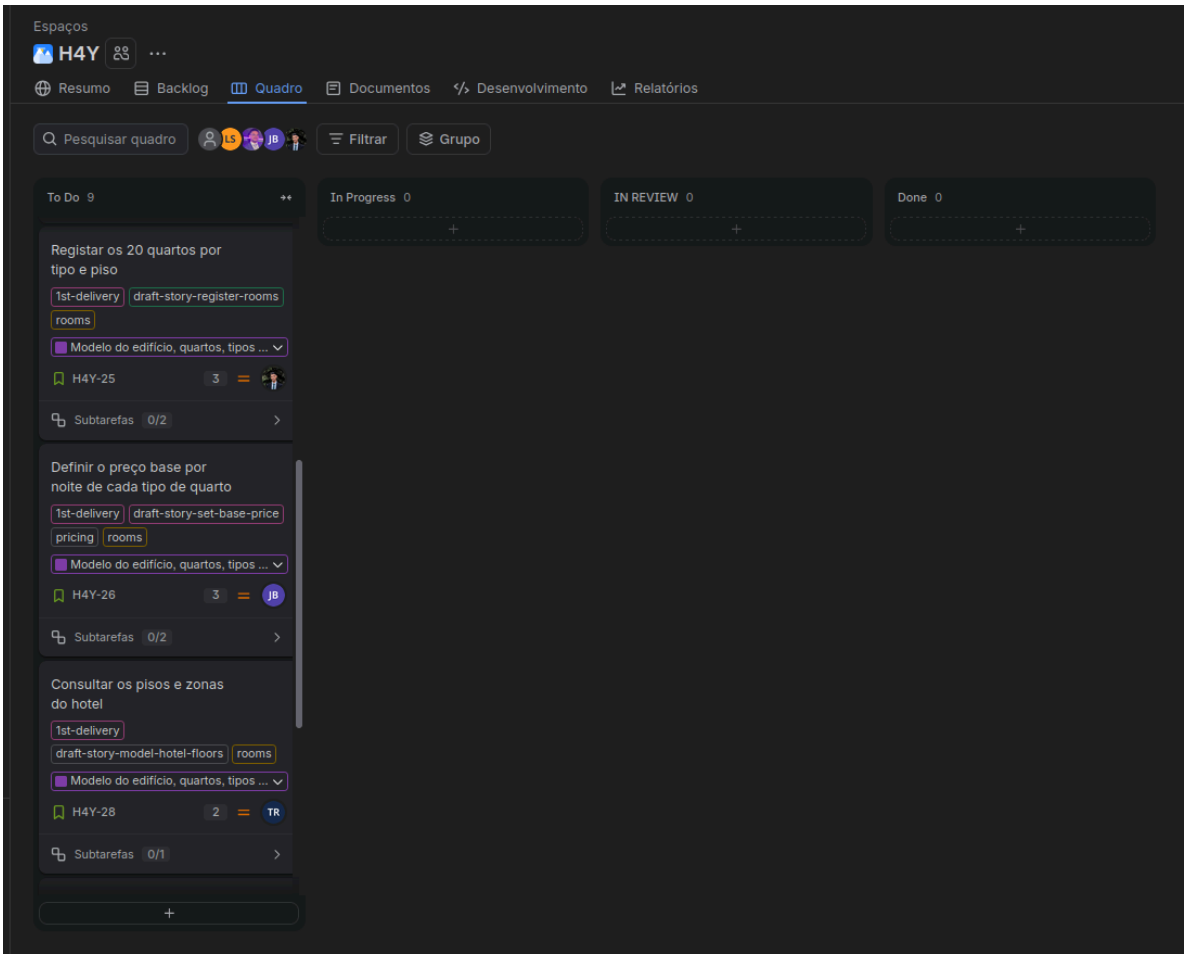

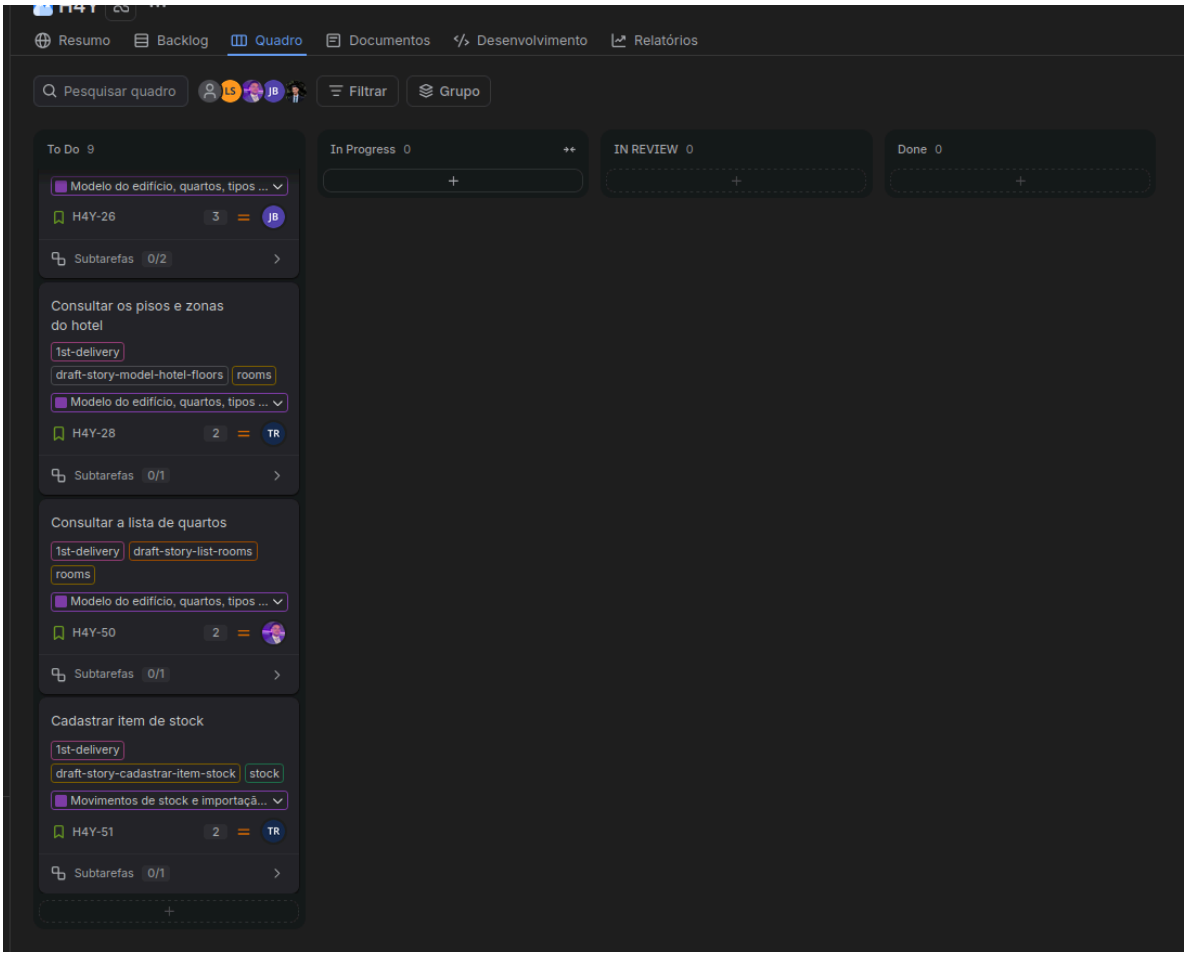
Resumo
Backlog
Quadro
Documentos
Desenvolvimento
Relatórios
Pesquisar quadro
Filtrar
Grupo
To Do 9
In Progress 0
IN REVIEW 0
Done 0
Modelo do edifício, quartos, tipos ...
H4Y-26
3
Subtarefas 0/2
Consultar os pisos e zonas do hotel
1st-delivery
draft-story-model-hotel-floors
rooms
Modelo do edifício, quartos, tipos ...
H4Y-28
2
Subtarefas 0/1
Consultar a lista de quartos
1st-delivery
draft-story-list-rooms
rooms
Modelo do edifício, quartos, tipos ...
H4Y-50
2
Subtarefas 0/1
Cadastrar item de stock
1st-delivery
draft-story-cadastrar-item-stock
stock
Movimentos de stock e importaçã...
H4Y-51
2
Subtarefas 0/1
